

RELATÓRIO DE OBRAS

Estruturação do Centro Estadual
de Gerenciamento de Riscos e
Desastres - CEGERD





IMAGEM 1 – PERSPECTIVA DO LOCAL DE INTERVENÇÃO

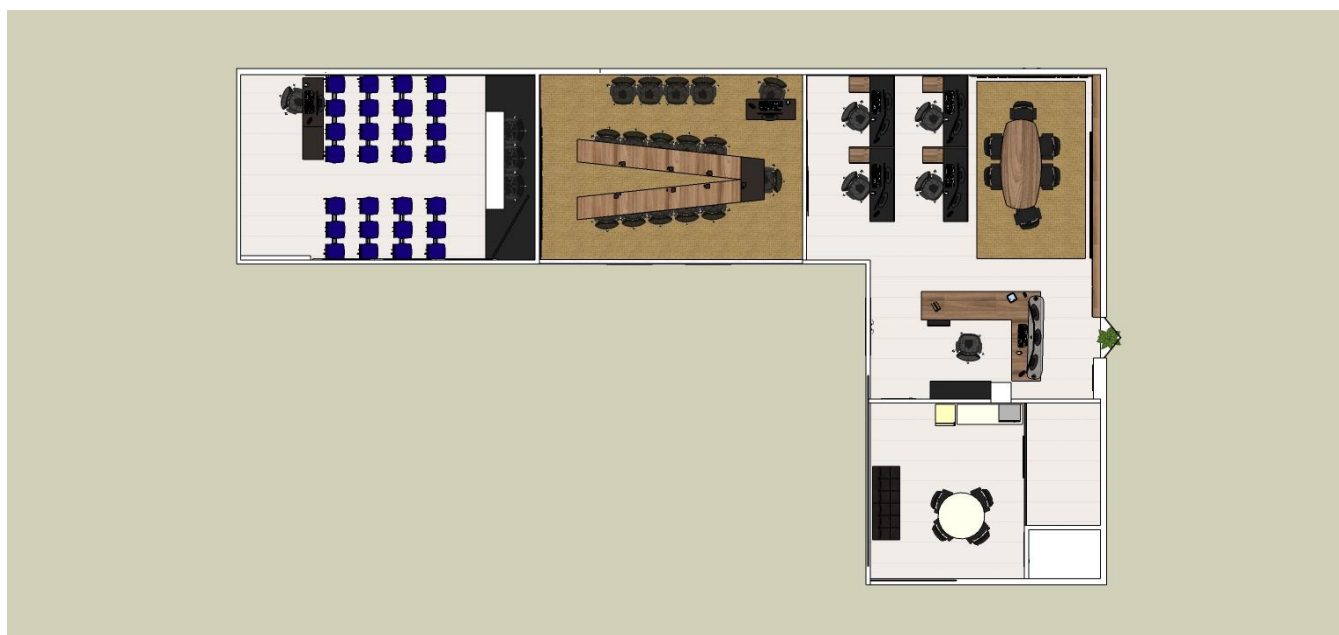


IMAGEM 2– IMPLANTAÇÃO DO LOCAL DE INTERVENÇÃO

DADOS DA OBRA:

Nome do Projeto:
Projeto Multissetorial para o
Desenvolvimento do Paraná.

Número do Empréstimo:
8201 SWAP-BR.

Objeto:
Adequação do espaço físico do Palácio
das Araucárias para instalação do
Centro Estadual de Gerenciamento de
Riscos e Desastres – CEGERD, no
Município de Curitiba.

Número do Edital:
NCB n.º 001/2015 – PRED.

Ref. Protocolo:
n.º 13.619.634-0.

**Acompanhamento e fiscalização
pela Casa Militar:**
Cap. QOBM Lucas Frates Simiano.

SEMANA 1

10/10/2016 - INÍCIO DAS OBRAS

Dia 1 / Semana 1
Segunda-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – ACESSO PRINCIPAL



FOTO 2 – VISTA PLANTÃO

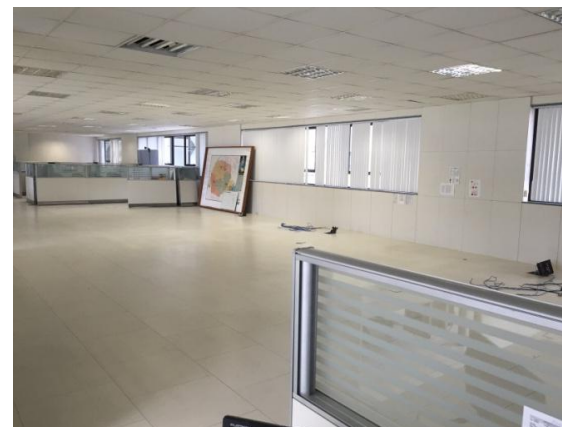



FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – SALA TÉCNICA

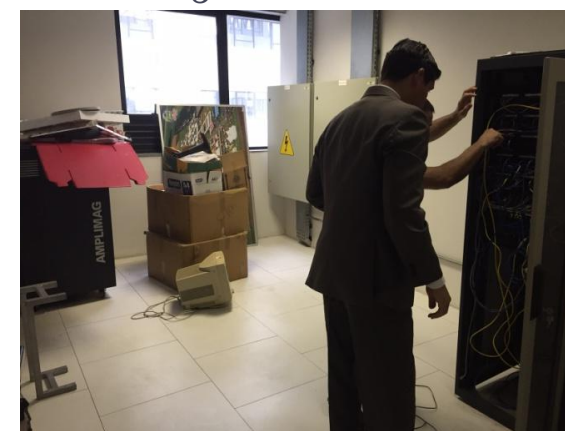

▣ Atividades desenvolvidas:

- Demolição de forro e gesso dos fundos do setor.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 10 horas.
- Reunião de partida da obra realizada às 15 horas, realizada conforme parte n.º 056/2016 – CEPED.
- A equipe que trabalhava no local, juntamente com representantes da TZ, foram orientados a providenciar EPI.

11/10/2016 - DEMOLIÇÕES

Dia 2 / Semana 1
Terça-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – ACESSO PRINCIPAL



FOTO 2 – VISTA PLANTÃO




FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – SALA TÉCNICA

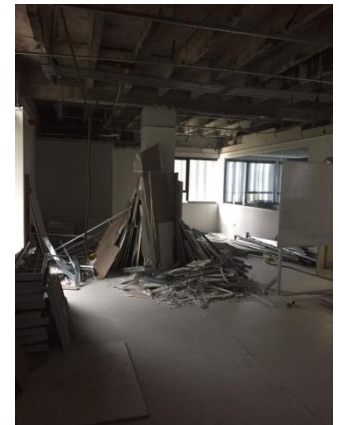

▣ Atividades desenvolvidas:

- Demolição de forro e gesso da área da reforma.
- Isolamento da área da reforma com tela branca.
- Previsão de chegada de materiais a partir das 17 horas.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas.
- A equipe que trabalha está com EPI, contudo em determinados momentos retira. Foram orientados a utilizar o tempo todo que trabalham na área isolada.

14/10/2016 - PERFIS METÁLICOS

Dia 5 / Semana 1
Sexta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – ACESSO PRINCIPAL



FOTO 2 – VISTA PLANTÃO



FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – VISTA SALA DE IMPRENSA



▣ Atividades desenvolvidas:

- Demolição de forro e gesso da área da reforma.
- Instalação dos perfis metálicos para a parede de *dry wall*.

▣ Observações:

- Devido à realização do I Congresso Brasileiro de RRD, nos dias 12 e 13 de outubro não foi possível tirar fotos do andamento das obras. Contudo, os serviços realizados no CEGERD foram acompanhados.
- Fotos retiradas às 09 horas.
- Nos dias 13 e 14 de outubro a equipe trabalhará até meia noite; nos dias 15 e 16 de outubro a equipe trabalhará até às 20 horas, conforme solicitação enviada via e-mail.

15/10/2016 e 16/10/2016

Dias 6 e 7 / Semana 1
Sábado e domingo

▣ Fotos:

FOTO 1 – ACESSO PRINCIPAL



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 – INSTALAÇÃO PLACAS DE GESSO



FOTO 5 – SALA DE IMPRENSA



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação dos perfis metálicos para a parede de *dry wall*.
- Instalação das placas de gesso nos perfis metálicos.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 09 horas do dia 17/10/2016.
- A equipe trabalhou no final de semana devidamente autorizada.

SEMANA 2

17/10/2016

Dia 1 / Semana 2
Segunda-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – ACESSO PRINCIPAL



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C

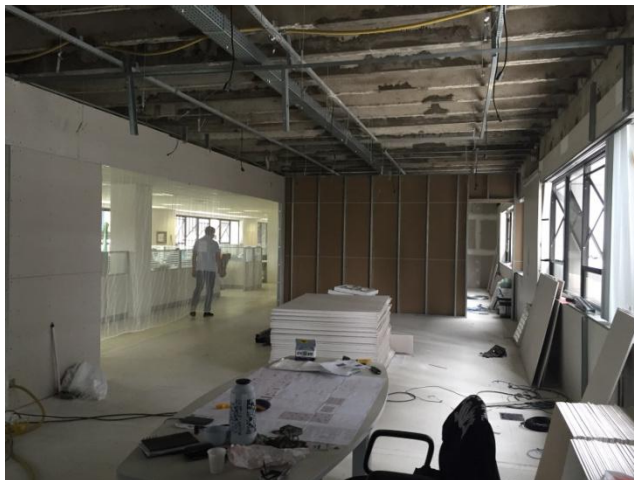


FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – SALA DE REUNIÕES



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação dos perfis metálicos para a parede de *dry wall*.
- Instalação das placas de gesso nos perfis metálicos.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 17/10/2016.
- Houve a segunda reunião de trabalho às 15 horas.

18/10/2016

Dia 2 / Semana 2
Terça-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C


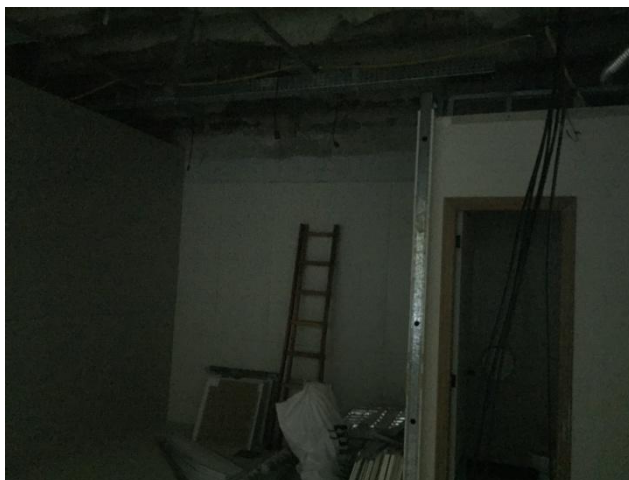


FOTO 5 – FUNDOS DA ALA C

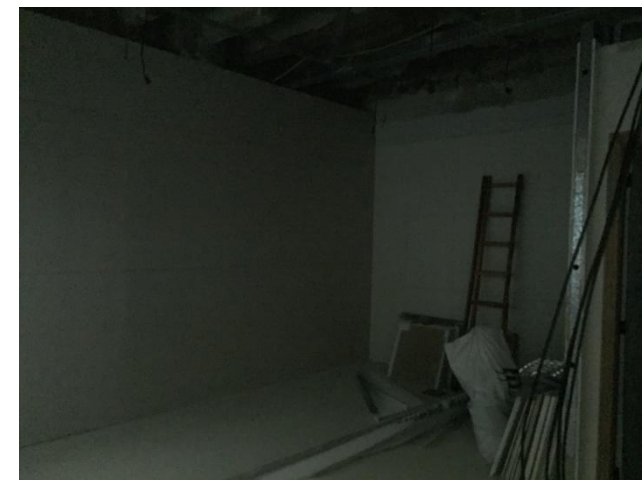

▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação dos perfis metálicos para a parede de *dry wall*.
- Instalação das placas de gesso nos perfis metálicos.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 18/10/2016.
- A empresa TZ trouxe EPIs extras para visitas e vistorias na obra.

19/10/2016

Dia 3 / Semana 2
Quarta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – ACESSO PRINCIPAL



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – FUNDOS DA ALA C



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação dos perfis metálicos para a parede de *dry wall*.
- Instalação das placas de gesso nos perfis metálicos.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 19/10/2016.

20/10/2016

Dia 4 / Semana 2
quinta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C

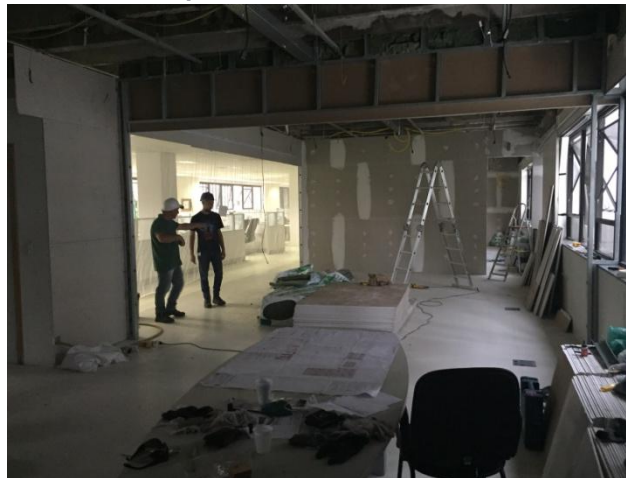


FOTO 5 – FUNDOS DA ALA C



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação dos perfis metálicos para a parede de *dry wall*.
- Instalação das placas de gesso nos perfis metálicos.
- Instalação do forro.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 20/10/2016.

21/10/2016

Dia 5 / Semana 2
Sexta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA




FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – ESTACIONAMENTO

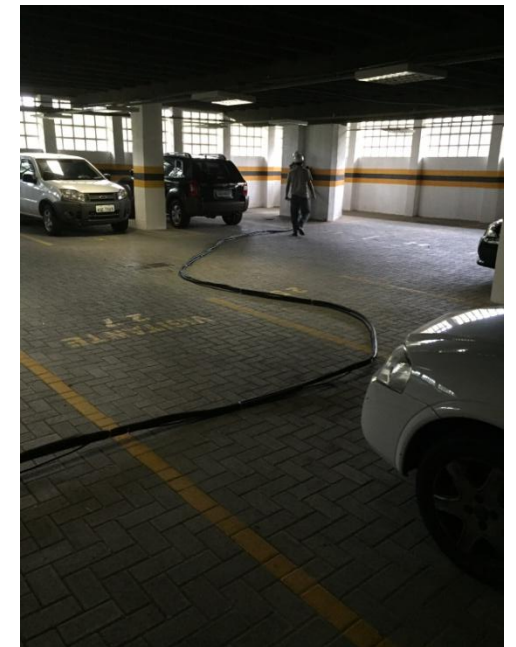

▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro.
- Instalação do ar condicionado.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 21/10/2016.

SEMANA 3

24/10/2016

Dia 1 / Semana 3
Segunda-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – ÁREA EXTERNA PA



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro.
- Instalação do ar condicionado.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 24/10/2016.
- Foi realizada a 3ª reunião com os responsáveis pela obra (Defesa Civil, SEAP, CELEPAR, TZ, Performance)
- Foi criado um grupo de whatsapp com pontos focais de todas as partes envolvidas.

25/10/2016

Dia 2 / Semana 3
Terça-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – INSTALAÇÃO DO FORRO



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro e do isolamento acústico do forro.
- Instalação do ar condicionado.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 25/10/2016.

26/10/2016

Dia 3 / Semana 3
Quarta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C

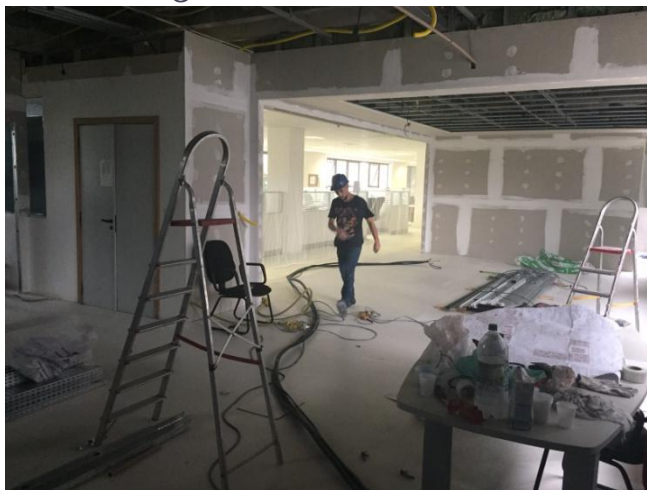


FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro e do isolamento acústico do forro.
- Instalação do ar condicionado.
- Passagem de massa nas paredes de dry-wall.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 26/10/2016.

27/10/2016 e 28/10/2016

Dias 4 e 5 / Semana 3
Quinta e sexta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – ACESSO ALA C



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – SALA DE DESCOMPRESSÃO



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro e do isolamento acústico do forro.
- Instalação do ar condicionado.
- Passagem de massa nas paredes de dry-wall e pintura.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 15 horas do dia 28/10/2016.

SEMANA 4

31/10/2016 e 01/11/2016

Dias 1 e 2 / Semana 4
Segunda e terça-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – ACESSO ALA C



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA

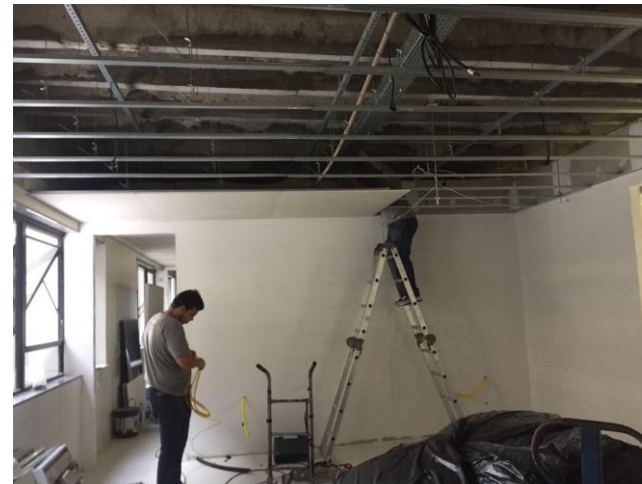


FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – ELETROCALHAS E ELETRODUTOS



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro e do isolamento acústico do forro.
- Passagem de cabos de elétrica pelo forro.
- Passagem de massa nas paredes de dry-wall e pintura.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 17 horas do dia 01/11/2016.
- Reunião de trabalho realizada na segunda-feira dia 31/10/2016.

03/11/2016 e 04/11/2016

Dias 4 e 5 / Semana 4
Quinta e sexta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE VÍDEOCONFERÊNCIA



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – ELETROCALHA



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro e do isolamento acústico do forro.
- Passagem de cabos de elétrica pelo forro.
- Passagem de massa nas paredes de dry-wall e pintura.

▣ Observações:

- O dia 02/11/2016 foi feriado.
- Fotos retiradas às 10 horas do dia 04/11/2016.
- Reunião de ajustes realizada na quinta-feira, às 15 horas, com as empresas Performance e TZ.

SEMANA 5

07/11/2016

Dia 1 / Semana 5
Segunda-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – PASSAGEM DE CABOS



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro e do isolamento acústico do forro.
- Passagem de cabos de elétrica pelo forro.
- Passagem de massa nas paredes de dry-wall e pintura.

▣ Observações:

- Houve a reunião semanal de trabalho, na qual a única empresa envolvida não presente foi a Belniaki.
- Fotos retiradas às 16 horas do dia 07/11/2016.

08/11/2016

Dia 2 / Semana 5
Terça-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C

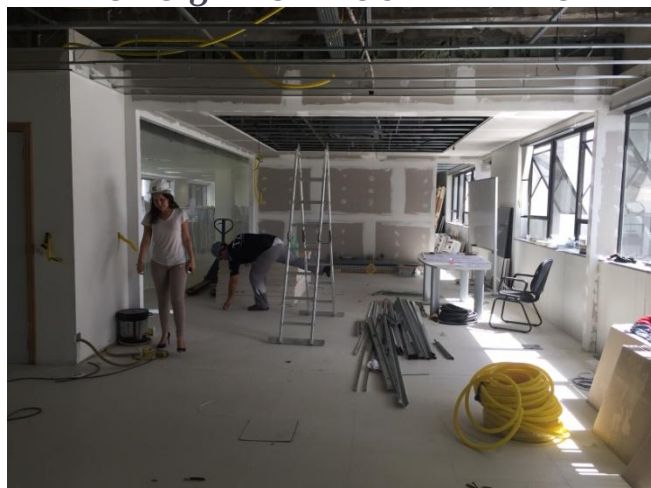


FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro e do isolamento acústico do forro.
- Passagem de cabos de elétrica pelo forro.
- Passagem de massa nas paredes de dry-wall e pintura.
- Finalização da instalação do ar-condicionado.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 08/11/2016.

09/11/2016 e 10/11/2016

Dias 3 e 4 / Semana 5
Quarta e Quinta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 – SALA TÉCNICA



FOTO 5 – INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro e do isolamento acústico do forro.
- Passagem de cabos de elétrica pelo forro.
- Passagem de massa nas paredes de dry-wall e pintura.
- Finalização da instalação do ar-condicionado.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 15 horas do dia 10/11/2016.
- Os equipamentos de ar condicionado estão ligados para teste e verificação do encanamento.

11/11/2016

Dia 5 / Semana 5
Sexta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – FUNDOS DA ALA C



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro e do isolamento acústico do forro.
- Passagem de cabos de elétrica pelo forro.
- Passagem de massa nas paredes de dry-wall e pintura.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 08/11/2016.
- Os equipamentos de ar condicionado estão ligados para teste e verificação do encanamento

SEMANA 6

16/11/2016

Dia 1 / Semana 6
Quarta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C


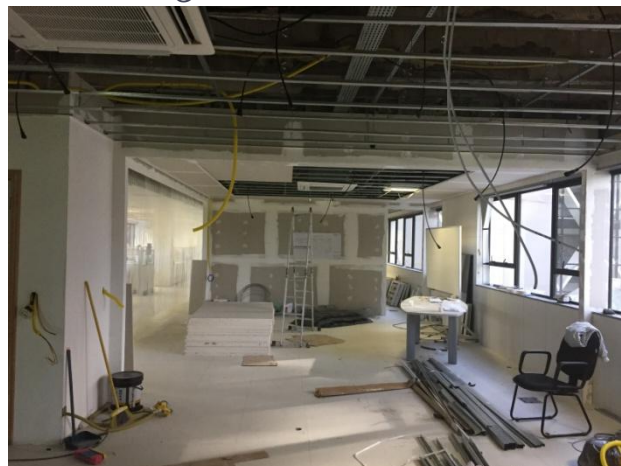


FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – FUNDOS DA ALA C

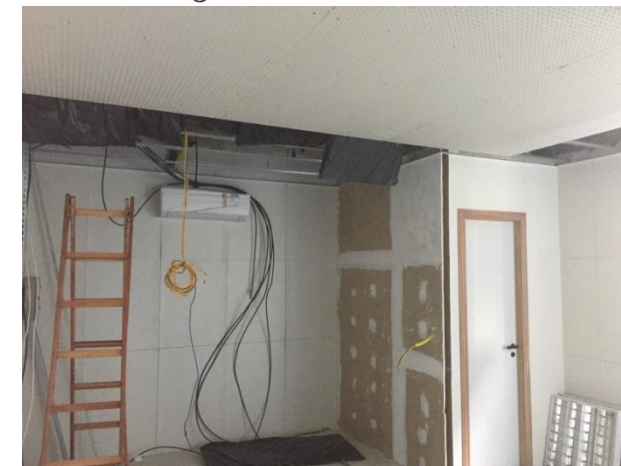

▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro e do isolamento acústico do forro.
- Passagem de cabos de elétrica pelo forro.
- Passagem de massa nas paredes de dry-wall e pintura.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 16/11/2016.
- Não foi feito registro dos dias 14 e 15 por ser feriado.

17/11/2016

Dia 2 / Semana 6
Quinta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 - FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 – LUMINÁRIA A SER INSTALADA



FOTO 5 – FUNDOS DA ALA C



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro e do isolamento acústico do forro.
- Passagem de cabos de elétrica pelo forro.
- Passagem de massa nas paredes de dry-wall e pintura.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 17/11/2016.

18/11/2016

Dia 3 / Semana 6
Sexta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA

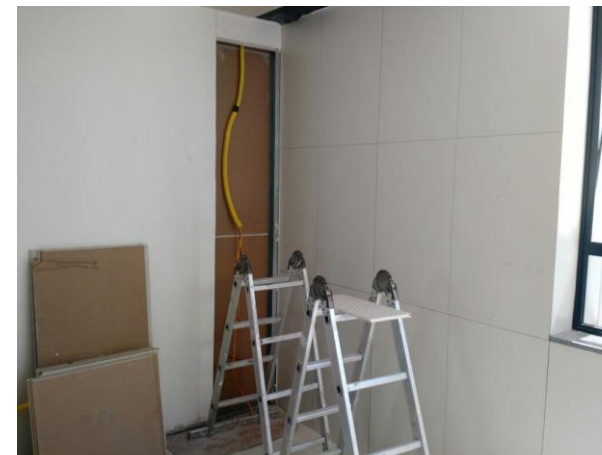


FOTO 3 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 4 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 5 – FUNDOS DA ALA C



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro e do isolamento acústico do forro.
- Passagem de cabos de elétrica pelo forro.
- Passagem de massa nas paredes de dry-wall e pintura.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 18/11/2016.

SEMANA 7

21/11/2016

Dia 1 / Semana 7
Segunda-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – FUNDOS DA ALA C



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro e do isolamento acústico do forro.
- Passagem de cabos de elétrica pelo forro.
- Instalação das portas de vidro.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 21/11/2016.
- O Relatório não será atualizado até a próxima segunda-feira devido à missão com o embaixador da Finlândia.

SEMANA 8

28/11/2016

Dia 1 / Semana 8
Segunda-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – ACESSO ALA C



FOTO 2 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 3 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – FUNDOS DA ALA C



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro e do isolamento acústico do forro.
- Passagem de cabos de elétrica pelo forro.
- Instalação das esquadrias de vidro.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 28/11/2016.

29/11/2016

Dia 2 / Semana 8
Terça-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 – ACESSO DA ALA C



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – FUNDOS DA ALA C



▣ Atividades desenvolvidas:

- Instalação do forro e do isolamento acústico do forro.
- Passagem de cabos de elétrica pelo forro.
- Preparação das paredes para pintura.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 29/11/2016.

30/11/2016 01/12/2016

Dias 3 e 4 / Semana 8
Quarta e quinta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 4 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 5 – FUNDOS DA ALA C



▣ Atividades desenvolvidas:

- Pintura das paredes.
- Acabamento do forro e pintura.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 30/11/2016.

02/12/2016

Dia 5 / Semana 8
Sexta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 – INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – FUNDOS DA ALA C



▣ Atividades desenvolvidas:

- Pintura das paredes.
- Acabamento do forro e pintura.
- Instalação das luminárias.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 02/12/2016.
- Neste sábado (03/12/2016) será instalado o carpete na sala de reuniões.

SEMANA 9

05/12/2016 e 06/12/2016

Dias 1 e 2 / Semana 9
Segunda e Terça-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – ACESSO ALA C



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – DETALHE CARPETE



▣ Atividades desenvolvidas:

- Pintura das paredes.
- Acabamento do forro e pintura.
- Instalação das luminárias.
- Passagem de cabeamento pelo piso elevado.

▣ Observações:

- O carpete foi instalado no final de semana.

07/12/2016

Dia 3 / Semana 9
Quarta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – ACESSO ALA C



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA




FOTO 3 – INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C



FOTO 5 – SALA DE REUNIÕES

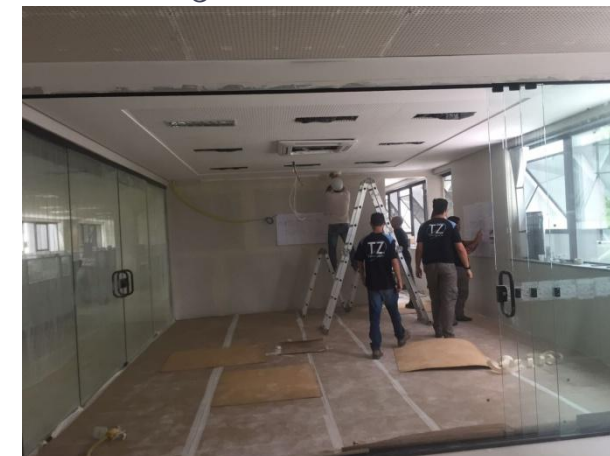

▣ Atividades desenvolvidas:

- Pintura das paredes.
- Acabamento do forro e pintura.
- Instalação das luminárias.
- Passagem de cabeamento pelo piso elevado.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 07/12/2016.

08/12/2016 e 09/12/2016

Dias 4 e 5 / Semana 9
Quinta e sexta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA TÉCNICA



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA




FOTO 3 – PORTA E RODAPÉS



FOTO 4 – PASSAGEM DE CABOS



FOTO 5 – SALA TÉCNICA POSTERIOR

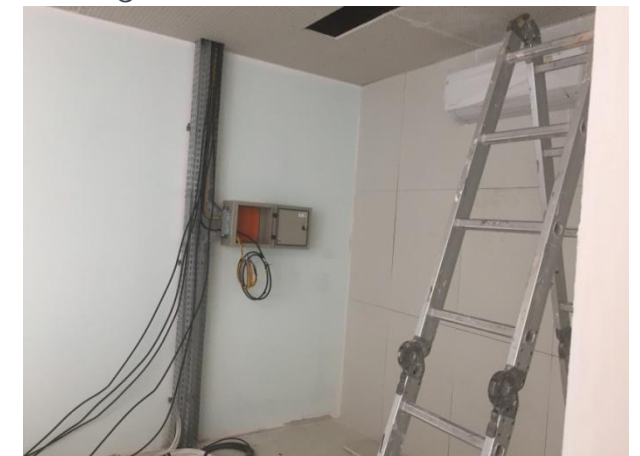

▣ Atividades desenvolvidas:

- Chegada de porta e rodapés.
- Acabamento do forro e pintura.
- Instalação das luminárias.
- Passagem de cabeamento pelo piso elevado.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 11 horas do dia 08/12/2016.

SEMANA 10

12/12/2016

Dia 1 / Semana 10
Segunda-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – ACESSO ALA C



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 – INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS



FOTO 4 – FUNDOS DA ALA C

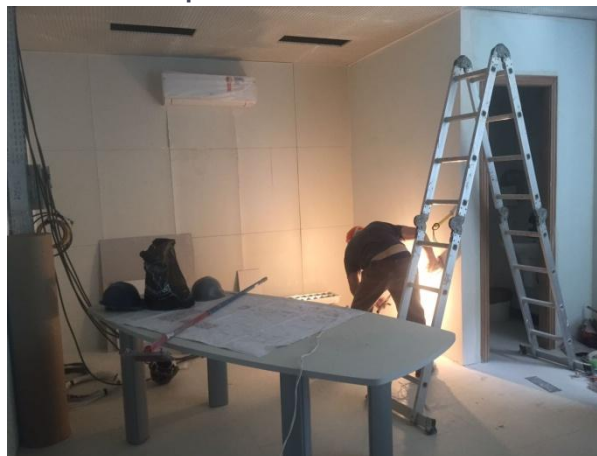


FOTO 5 – SALA DE REUNIÕES



▣ Atividades desenvolvidas:

- Pintura das paredes.
- Acabamento do forro.
- Instalação das luminárias.
- Passagem de cabeamento pelo piso elevado.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 14 horas do dia 12/12/2016.

13/12/2016 e 14/12/2016

Dias 2 e 3 / Semana 10
Terça e quarta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA TÉCNICA



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 – INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS



FOTO 4 – SALA TÉCNICA



FOTO 5 – SALA DE REUNIÕES



▣ Atividades desenvolvidas:

- Pintura das paredes.
- Acabamento do forro.
- Instalação das luminárias.
- Passagem de cabeamento pelo piso elevado.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16 horas do dia 13/12/2016.

15/12/2016 e 16/12/2016

Dias 4 e 5 / Semana 10
Quinta e sexta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – ACESSO ALA C



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 – INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS



FOTO 4 – FUNDOS ALA C



FOTO 5 – SALA DE REUNIÕES



▣ Atividades desenvolvidas:

- Pintura das paredes.
- Acabamento do forro.
- Instalação das luminárias.
- Passagem de cabeamento pelo piso elevado.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 17horas do dia 15/12/2016.

SEMANA 11

19/12/2016 e 20/12/2016

Dias 1 e 2/ Semana 11
Segunda e terça-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – ACESSO ALA C



FOTO 2 – CAIXA DE PASSAGEM



FOTO 3 – INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS



FOTO 4 – FUNDOS ALA C



FOTO 5 – SALA DE REUNIÕES



▣ Atividades desenvolvidas:

- Acabamento do forro.
- Instalação das luminárias.
- Passagem de cabeamento pelo piso elevado.
- Montagem das divisórias / organização do lay-out.

▣ Observações:

- No final de semana foram feitos os furos das caixas de passagem sob piso elevado.
- Fotos retiradas às 16horas do dia 19/12/2016.

22/12/2016 e 23/12/2016

Dias 4 e 5/ Semana 11
Quinta e sexta-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – ACESSO ALA C



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 – INSTALAÇÃO DO MOBILIÁRIO



FOTO 4 – FUNDOS ALA C



FOTO 5 – INSTALAÇÃO DO MOBILIÁRIO



▣ Atividades desenvolvidas:

- Acabamento do forro.
- Montagem do mobiliário (outro edital, realizado pela empresa Belniaki).
- Pintura.
- Montagem das divisórias / organização do lay-out.

▣ Observações:

- Fotos retiradas às 16horas do dia 19/12/2016.

SEMANA 12

De 26/12/2016 a 30/12/2016

Semana 12

▣ Fotos:

FOTO 1 – SALA TÉCNICA



FOTO 2 – INSTALAÇÃO DE CABOS



FOTO 3 – INSTALAÇÃO DE CABOS



FOTO 4 – INSTALAÇÃO DE CABOS



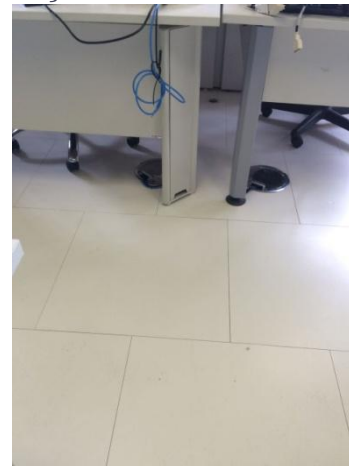


FOTO 5 – INSTALAÇÕES DIVERSAS

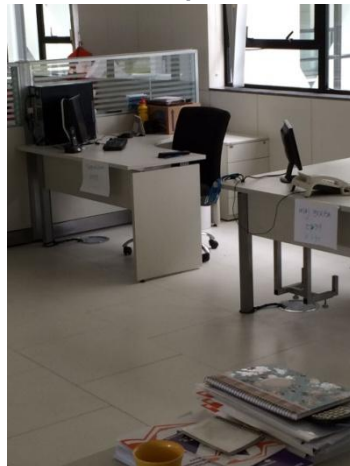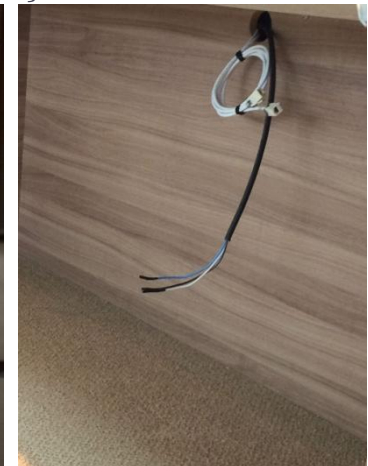

▣ Atividades desenvolvidas:

- Acabamento do forro.
- Montagem do mobiliário (outro edital, realizado pela empresa Belniaki).
- Instalação e teste de cabos e conexões.

▣ Observações:

- Fotos retiradas no dia 29/12/2016.

SEMANA 13

02/01/2017

Dia 1 / Semana 13
Segunda-feira

▣ Fotos:

FOTO 1 – ACESSO ALA C



FOTO 2 – SALA DE IMPRENSA



FOTO 3 – SALA DE REUNIÕES



FOTO 4 – FUNDOS ALA C



FOTO 5 – SALA DE REUNIÕES



▣ Atividades desenvolvidas:

- Acabamento do forro.
- Montagem do mobiliário (outro edital, realizado pela empresa Belniaki).
- Instalação e teste de cabos e conexões.

▣ Observações:

- Para finalização do serviço pela empresa TZ, resta a conclusão da instalação do mobiliário.
- Fotos retiradas às 10 horas do dia 02/01/2017.
